


Progetto esecutivo per i lavori di trasformazione del campo da calcio da sabbia calcarea a erba artificiale

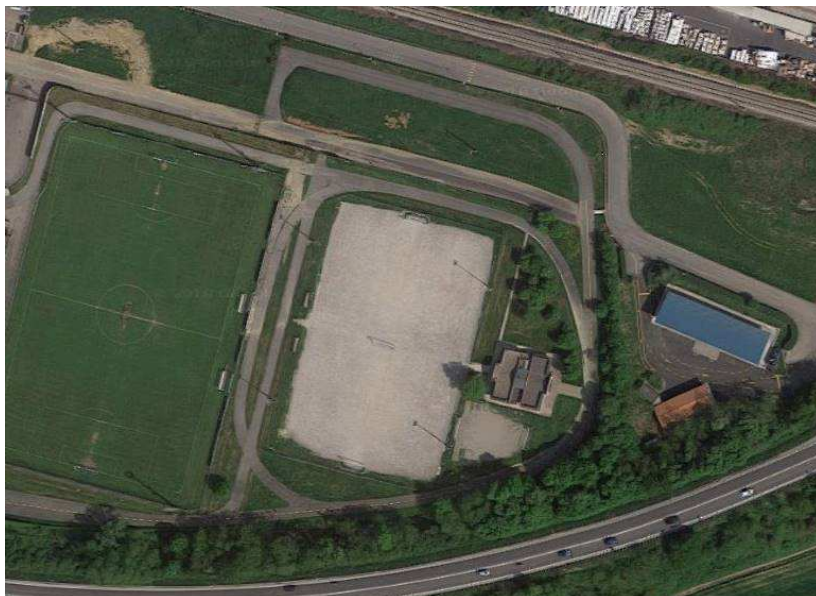

K. DIAGRAMMA DI GANTT

COMMITTENTE: Comune di Albano Sant’Alessandro

Dicembre 2018

studio **28**architettura
architetti associati

24128 Bergamo, via Nullo 28/a
Tel. 035.243747 Fax 035.248074
Info@studio28a.it

Arch. Alberto Roscini
Iscritto Albo Arch. Bg n° 645

Arch. Francesco Di Prisco
Iscritto Albo Arch. Bg n° 1493

Arch. Marco Benedetti
Iscritto Albo Arch. Bg. n° 2156

ALLEGATO "A"

Comune di Albano Sant'Alessandro
Provincia di BG

DIAGRAMMA DI GANTT

cronoprogramma dei lavori

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. - D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: Progetto esecutivo per i lavori di trasformazione del campo da calcio da sabbia calcarea a erba artificiale

COMMITTENTE: AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI ALBANO SANT'ALESSANDRO

CANTIERE: Via Don. G. Canini, Albano Sant'Alessandro (BG)

Albano Sant'Alessandro, 12/12/2018

per presa visione

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

IL COMMITTENTE

(Studio 28 architettura \$EMPTY_CSP_03\$ Arch. Francesco Di Prisco)

(RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO \$EMPTY_COM_10\$ Geom. Fabio Marchesi)

Studio 28 architettura \$EMPTY_CSP_03\$ Arch. Francesco Di Prisco
Via F. Nullo, 28/a
24128 BERGAMO (BG)
Tel.: 035. 243747 - Fax: 035.248074
E-Mail: info@studio28a.it

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.

TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt

FASI DI LAVORO	I	gg L	gg C
ALLESTIMENTO DEL CANTIERE			
Allestimento di cantiere	1	4	4
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi	1	2	4
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	1	3	5
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere	1	2	2
CAMPO DA CALCIO a 11			
Rimozione di porte da calcio e panchine	1	1	1
Scavo di splatemento	1	7	11
Sterro e riporto per risonamento del profilo del terreno	1	4	4
Stabilizzazione del terreno di posa	1	7	9
Stesura strato di sabbia	1	6	8
Scavo a sezione obbligata	1	9	11
Cordoli, canalette e opere d'arte	1	20	33
Posa di tubi drenaggio e scarico in materie plastiche	1	9	14
Pozzetti di ispezione	1	10	14
Getto in calcestruzzo per platea panchine e plinti per porte calcio	1	3	3
Fornitura e posa manto in erba sintetica	1	15	21
Posa di panchine, porte da calcio	1	4	4
RECINZIONI			
Posa di recinzioni in rete metallica plastificata	2	14	18
OPERE COMPLEMENTARI			
Smantellamento impianto illuminazione campo calcio	2	3	3
Scavo a sezione obbligata	2	8	12
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione	2	6	9
Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione	2	3	4

Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione	2	1	1
Posa di conduttura elettrica	2	5	8
Pozzetti di ispezione e opere d'arte	2	2	5
Scavo a sezione ristretta	2	4	7
Posa di tubazioni impianti	2	5	7
Pozzetti di ispezione e opere d'arte	2	3	3
Posa della cisterna per impianto irrorazione	2	4	6
Cordoli	2	8	10
Formazione di massiciata	2	9	13
Realizzazione della pavimentazione esterna	2	16	22
Posa di pavimenti autobloccanti per esterni	2	3	3
IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE CAMPO DA CALCIO A 11			
Posa di torri faro illuminazione	3	10	17
Montaggio di apparecchi illuminanti	3	5	7
IMPIANTO DI IRRORAZIONE			
Scavo per condotte interrate	1	6	8
Realizzazione della rete idrica e degli attacchi per impianto irrorazione	1	8	10
SMOBILIZZO DEL CANTIERE			
Smobilizzo del cantiere	1	3	5

LEGENDA:

I = IMPRESA

Elenco delle Imprese presenti nel Programma Lavori:

1) = IMPRESA SPECIALIZZATA CAMPI CALCIO

2) = IMPRESA EDILE

3) = IMPIANTI ELETTRICI

gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

